

Ziņojums par Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) ERAF projekta
“**Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta**”
(Vienošanās Nr.2.2.1.1/19/I/005)
īstenošanas statusu

Projekta nosaukums: Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta

Projekta ieviešanas periods: 26.11.2019. – 25.11.2022.

Saņēmējs: Būvniecības valsts kontroles birojs

Projekta partneri: EM, VZD, TA, PMLP, ZMNĪ, LNA, LVGMC, VRAA

Ziņojums par periodu: 26.11.2019. – 30.03.2020.

1. Projekta mērķi

Projekta vispārējais mērķis	Nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību.
Projekta mērķis	<p>1.Būvniecības nozares produktivitātes un būvniecības procesa efektivitātes kāpināšana, paaugstinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu būves dzīves cikla pārvaldībā.</p> <p>2.Administratīvā sloga samazināšana privātpersonām un juridiskām personām.</p> <p>3.Pakalpojumu pieejamības uzlabošana un publisko datu atkalizmantošanas pieaugums.</p> <p>Projekta mērķis ir BIS pilnveidošana, ieskaitot procesu optimizācijas un automatizācijas turpināšanu (pēc 1.kārtā veiktajiem procesu pilnveides darbiem) (ieceres iesniegšanas, saskaņošanas, būvniecības procesa kontroles, nodošanas un ekspluatācijas stadijām sistēmā), administratīvā sloga ietekmes mazināšana, automatizēta analītisku lēmumu pieņemšanas rīka (aģenta) izveide, un sistēmas uzlabošana, lai tā būtu vienota platforma jebkuras būves dzīvescikla pārvaldībai no ieceres līdz ekspluatācijas beigām, kā arī pamats Būves informācijas modelēšanas (turpmāk – BIM) procesu ieviešanai Latvijā un nodrošinātu nepieciešamo platformu no valsts informācijas sistēmas puses. BIM iespēju īstenošana BIS ietvaros ir projekta pamatievīze un katras problēmjas risinājums ir daļa, kas veicina un īsteno BIM kopējo procesu – tas ir, katrs risinājums veido kopīgu centralizētu platformu BIM procesa ieviešanai.</p>



2. Projekta ieviešanas gaita

Projekta aktiv. Nr.	Projekta aktivitātes nosaukums	Plānotais rezultāts	Sasniegtais rezultāts	Pārskata periodā veiktās aktivitātes
1.	Projekta vadība un īstenošana	Īstenots projekts		<ul style="list-style-type: none"> - Projekta ietvaros kopā notikušas 1 (no tām pārskata periodā 1) Būvniecības informācijas sistēmas Konsultatīvās padomes sēdes. - Projekta ietvaros kopā notikušas 1 (no tām pārskata periodā 1) Projekta valdes sēdes. - Projekta ietvaros kopā notikušas 15 (no tām pārskata periodā 15) Projekta vadības darba grupas sēdes. - Projekta ietvaros kopā notikušas 15 (no tām pārskata periodā 15) projekta komandas sēdes. - Projekta ietvaros kopā notikušas 3 (no tām pārskata periodā 3) projekta darba grupas. - Projekta ietvaros kopā sagatavoti 1 (no tām pārskata periodā 1) Maksājumu pieprasījumi.
2.	Konsultācijas pakalpojumu sniegšana			
2.1.	Projekta pamatojošās dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un pārvaldība elektroniskā kopdarbības vidē	Sagatavota projekta pamatojošā dokumentācija	Sagatavota projekta pamatojošā dokumentācija	<p>2018.gada 26.aprīlī tika noslēgta vienošanās ar SIA "AA Projekts" par Konsultāciju pakalpojumu sniegšanu ERAF projekta "Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība 2.kārta" plānoto darbību īstenošanai. Darbība ir uzsākta pirms projekta īstenošanas un sagatavoti dokumenti uz projekta iesnieguma sagatavošanas brīdi.</p> <p>Izstrādāts Detalizētais projekta apraksts.</p> <p>Izstrādāts Izmaksu un ieguvumu analīzes dokuments.</p> <p>Dokumenti izstrādāti.</p> <p>Aktivitāte ieviesta.</p>



2.2.	Informācijas sistēmas izstrādes iepirkuma Tehniskās specifikācijas izstrāde	Izstrādāta tehniskā specifikācija	Izstrādāta tehniskā specifikācija	Tehniskā specifikācija izstrādāta. Iepirkums noorganizēts, sniegts atbalsts iepirkuma norises laikā un BIS funkcionalitātes pilnveides darbus veiks SIA Tieto Latvia. Aktivāte ieviesta.
2.3.	Projekta ieviešanas dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un kvalitātes kontrole	Nodrošināta kvalitātes kontrole un dokumentācijas izstrādes pakalpojums		
2.3.1.	Būvniecības procesu pilnveides tehnisko specifikāciju izstrāde un biznesa procesu un biznesa prasību specifikāciju izstrāde	Izstrādātas 8 gb. Tehniskās specifikācijas	1 gb.	Pārskata periodā izstrādāta 1.laidiena tehniskā specifikācija “Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide”. (1 gb.) Uzsākta tehniskās specifikācijas izstrāde 2.laidienam “Būvniecības process – 1.daļa”.
2.3.2.	Informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole	Veikta informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole (36 mēneši)	1 ziņojums	Līdz šim projekta ietvaros organizētas 15 sanāksmes informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas kontroles nodrošināšanai, no tām pārskata periodā 15 sanāksmes. Sagatavots 1 ziņojums par kvalitātes kontroles nodrošināšanu, no tiem 1 ziņojums pārskata periodā.
3.	Informācijas sistēmas pilnveide			
3.1.	Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide	Pilnveidots Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas process (1 gab.). Izstrādāti/pilnveidoti epakalpojumi (4 gab.): •Būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņojuma saņemšana •Trešo personu		2019.gada 6.decembrī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA Tieto Latvia par BIS funkcionalitātes pilnveides un uzturēšanas darbiem. Līguma ietvaros uzsākta 1.laidiena darba grupas lietotārstāstu izstrādei.



		saskaņojuma saņemšana •Pieklūve būvniecības lietai		
3.2.	Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide	Pilnveidots Būvniecības uzraudzības process (1 gab.). Pilnveidots epakalpojums: 1) Sūdzību iesniegšana (1 gab.) Atvērto datu kopas: 1) Ar būvniecību saistīto valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites informācija (sniegto pakalpojumu skaits) (1 gab.). 2) Būvniecības informācijas sistēmā veikto saskaņojumu uzskaites informācija (1 gab.).		
3.3.	Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide	Pilnveidots Būvju ekspluatācijas uzraudzības process (1 gab.). un izstrādāts epakalpojums - Būves ekspluatācijas lieta (1 gab.).		
3.4.	Būvkomersantu datu pārvaldības procesa pilnveide	Pilnveidots Būvkomersantu datu pārvaldības process (1 gab.). pilnveidots epakalpojums – Dati no būvkomersantu reģistra (1 gab.). Atvērto datu kopa – Būvkomersantu raksturojošā informācija (no papildinātā klasifikatora) (1 gab.).		
3.5.	Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide	Pilnveidots Būvspeciālistu datu pārvaldības process (1 gab.). Atvērto datu kopas - sertificēto būvspeciālistu raksturojošie dati (1 gab.).		



3.6.	Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide	Pilnveidots Ēku energoefektivitātes pārvaldības process (1 gab.). Atvērto datu kopas (2 gab.): - energosertifikācijas neatkarīgo ekspertu dati; - ekspluatācijā nodoto ēku energoefektivitātes rādītāju dati.		
3.7.	Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide	Pilnveidots Apziņošanas un informēšanas process (1 gab.). Pilnveidoti e-pakapojums: Atgādinājumu saņemšana (1 gab.).		
3.8.	Būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaites procesa izveide	Izstrādāts būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaites process		
3.9.	Administratoru un BIS lietotāju apmācības, t.sk. atbalsta materiālu izstrāde.	Apmācīti 700 BIS administratori un lietotāji par jaunizveidoto funkcionalitāti. Izstrādāti 8 pilnveidotajiem/izveidotajiem būvniecības procesiem apmācību, atbalsta un lietotāju materiāli, t. sk. interaktīvi materiāli un rokasgrāmatas.		
4.	IS ieviešanas kvalitātes kontrole (audits)	4 Audita ziņojumi		
5.	Publicitāte	Preses relīzes		Izgatavots informatīvs plakāts par projektu. Izvietots BVKB Kancelejā, K.Valdemāra ielā 157, Rīga, klientiem un iedzīvotājiem labi pieejamā un pārredzamā vietā.



				<p>Izveidota sadaļa informācijas publicēšanai par ERAF 2.kārtas projekta ieviešanas gaitu BIS portālā: https://bis.gov.lv/bisp/bis-projekti/eraf-projekts-2karta</p> <p>Sagatavota publikācija par projekta uzsākšanu: 1) 27.11.2019. Noslēgta vienošanās par Būvniecības informācijas sistēmas tālāku attīstīšanu https://bvkb.gov.lv/lv/news/noslegta-vienosanas-par-buvniecibas-informacijas-sistemas-talaku-attistisanu</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Projekta uzsākšana un sadarbības partneri

Pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2019.gada 20.septembra lēmumu Nr.39-2-60/7622 par projekta iesnieguma Nr.2.2.1.1/19/I/005 "Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)" apstiprināšanu ar nosacījumu un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2019.gada 26.novembra atzinumu Nr.39-2-60/9136 par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, 2019.gada 26.novembrī starp Būvniecības valsts kontroles biroju (Finansējuma saņēmējs) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgta Vienošanās "Par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/005 īstenošanu".

Pārskata periodā noslēgti arī sadarbības līgumi ar Projekta Sadarbības partneriem par sadarbību Projekta ieviešanā. Projekta sadarbības partneri: Ekonomikas ministrija, Tiesu administrācija, Valsts zemes dienests, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi.

Organizēti arī divi publiskie iepirkumi, lai nodrošinātu Projekta īstenošanu:

- 2018.gada 26.aprīlī tika noslēgta vienošanās ar SIA "AA Projekts" par Konsultāciju pakalpojumu sniegšanu ERAF projekta "Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība 2.kārta" plānoto darbību īstenošanai (EIS e-pasūtījumu apakšsistēmas iepirkums Nr.BVKB/2018/18).
- 2019.gada 6.decembrī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA Tieto Latvia par "Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu projekta "Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta" ietvaros (Atklāts konkurss virs ES sliekšņa PIL (MK 107) iepirkums Nr.2019/BVKB/1/BIS/ERAF).

Projekta ietvaros pārskata periodā ir tikusi organizēta arī pirmā Projekta Konsultatīvās padomes sēde. BVKB ERAF BIS attīstības 1.kārtas projektam un ERAF BIS attīstības 2.kārtas projekta Konsultatīvās padomes tiek organizētas kopā. Ar sēdes nolikumu, dalībniekiem un protokoliem, var iepazīties BIS portālā: <https://bis.gov.lv/bisp/bis-projekti/bis-konsultativa-padome>


4. Projekta aktivitāšu ieviešanas tuvākie plāni un grafiks

Nākamajā periodā (2020.gada II.ceturksnis) plānots turpināt darbu 1.laidiena "Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide" lietotārstāstu izstrādē un saskaņošanā. Tiks uzsākta 1.laidiena funkcionalitātes izstrāde.

Kā arī pabeigta 2.laidiena "Būvniecības process – 1.daļa" izstrādi un saskaņošanu, uzsākt lietotārstāstu izstrādes darba grupas.



Aktivitāšu ieviešanas grafiks

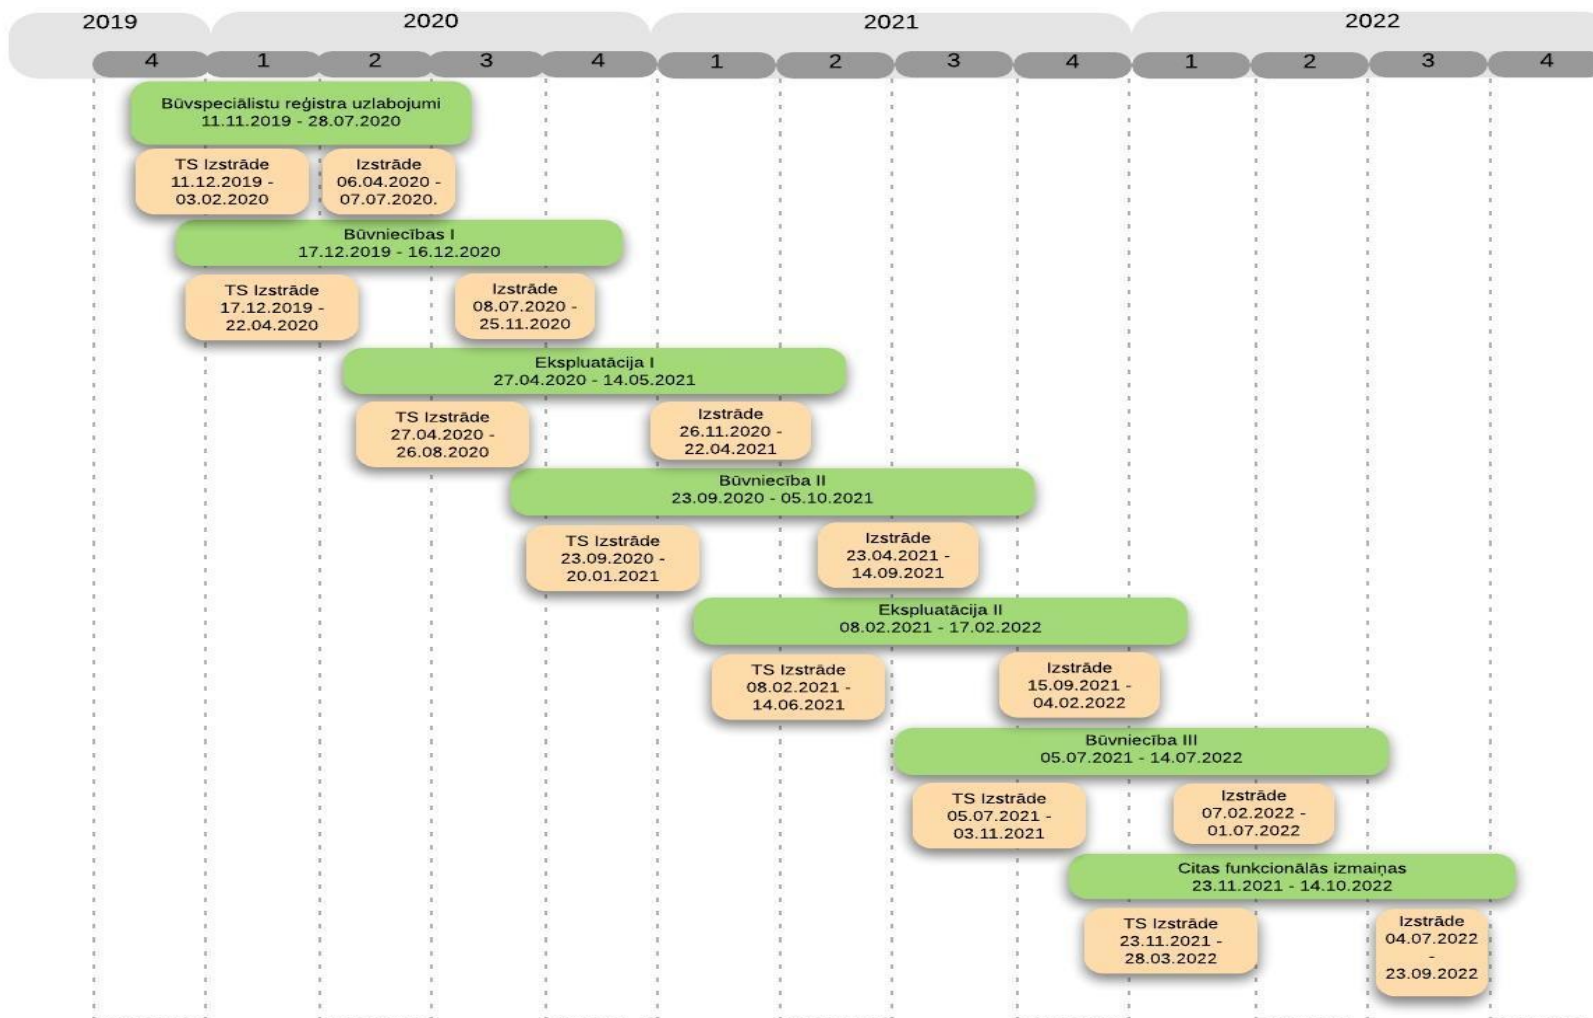

5. Progresā informācija un materiāli:

Informācija par projekta progresu Būvniecības informācijas sistēmas portālā -
<https://bis.gov.lv/bisp/bis-projekti/eraf-projekts-2karta>

Līdz šim izstrādātie apmācību materiāli pieejami:

- <http://bvkb.gov.lv/lv/content/informativie-seminari>;
- https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqaIjBLz2QWCreamvHA?view_as=subscriber

Vebināru ieraksti:

<https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMjAvMDEvMjEvMXNibzdyZGY5cF9QYW1hY2liYXMucGRmIl1d/Pamacibas.pdf>

BIS lietotāju informatīvie un atbalsta materiāli:

- Informatīvs buklets

http://bvkb.gov.lv/sites/default/files/bis_brosura_2019.pdf

- Informatīvais materiāls projektētājiem

https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMTEvMTMvNm10HBNWl1N1V9CSVNfSW5mb19ncmFmaWthX3Byb2pla3RldGFqaWVtLnBuZyJdXQ/BIS_Info_grafika_projektetajiem.png

- Informatīvais materiāls būvniekiem

https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMTEvMTMvMXJieWZreWIwOF9CSVNfSW5mb19ncmFmaWthX2J1dm5pZWtpZW0ucG5nIl1d/BIS_Info_grafika_buvniekiem.png

- Informatīvie materiāli tehnisko noteikumu izdevējiem

https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMTEvMTMvM2h5ZjQzcHp5N19CSVNfSW5mb19ncmFmaWthX1ROSS5wbmciXV0/BIS_Info_grafika_TNI.png

Sekoiet līdz arī Būvniecības valsts kontroles biroja jaunumiem sociālo tīklu profilos:

Facebook lapā <https://www.facebook.com/bvkb.lv>

Youtube kontā

https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqaIjBLz2QWCreamvHA?view_as=subscriber

Twitter kontā <https://twitter.com/BBirojs>

6. Kontaktinformācija:

Būvniecības valsts kontroles birojs

Informāciju sistēmu departaments

Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas

Projekta vadītāja Aija Vule

Aija.Vule@bvkb.gov.lv

Tel.: +371 67013311
